




**Тігзотівкв нвчвльннх звкльдів мїств Кїевв  
до почвтку 2017-2018 нвчвльного року  
тв роботн в осїнньо-зїмввїї перїод**

# Бюджет міста Києва по галузі «Освіта» у 2017 році



на 3,1 млрд. грн.  
більше (42%)  
ніж у 2016 році



Підготовка закладів освіти  
міста до нового 2017/2018  
навчального року

# Будівництво, реконструкція, капітальні ремонти

Передбачено  
**1,2 млрд.грн**



**518,5** млн.грн  
на капітальний ремонт

**366,0** млн.грн  
на реконструкцію закладів освіти

**323,5** млн.грн  
на будівництво навчальних закладів



# У 2017 році планується введення в дію 12 об'єктів

**ЗНЗ**

Дарницький

97,6



Солом'янський

104,1



Голосіївський

39,1



Дарницький

60,0



МЛН.ГРН.

**ДНЗ**

Голосіївський

76,8



Дарницький

75,0



Дарницький

32,0



Деснянський

73,2



Дарницький

80,0



Дніпровський

19,0



Голосіївський

31,1



Дніпровський

31,4



**нове будівництво**

**реконструкція**



**КОШТИ ІНВЕТОРІВ**

# Термомодернізація 2017



ДНЗ №221  
(Голосіївський)

ДНЗ №382  
(Солом'янський)

ШДС «Кобзарик»  
(Шевченківський)

**ЗАПЛАНОВАНО**

КОШТИ НЕФКО  
31,0 млн.грн



№ 8 (Подільський)

№ 96 (Подільський)

№ 598 (Оболонський)

№ 565 (Святошинський)  
введено в експлуатацію



**ПРОВЕДЕНО**

бюджетні кошти  
28,0 млн.грн

# Капітальні ремонти, фінансування яких здійснюється через інші Департаменти

**50,0 млн.грн**

Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на капітальний ремонт закладів освіти

?

**155,0 млн.грн**

Департамент будівництва та житлового забезпечення на капітальний ремонт


**70 дошкільних  
навчальних закладів**

# Капітальний ремонт спортивних залів

**Замовник виконання робіт:**  
**КП «Київбудреконструкція»**

Передбачено 23,8 **млн.грн.**  
Освоєно **4,8 млн.грн /20,2%**

**План 38 НЗ**



**Виконано**

**Розпочато роботи**

У 2017 році кошти для районних управлінь освіти на продовження програми «Спортивні зали ЗНЗ» не виділено



# Загальнооміські програми

676,8 млн. грн.

- ✓ Заміна вікон
- ✓ Підготовка до нового 2017-2018 навчального року
- ✓ Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період
- ✓ Відновлення груп у ДНЗ
- ✓ Придбання комп'ютерної техніки
- ✓ Придбання меблів


## розпочато 3 нові програми:



- ✓ Дріб'язок на побутові потреби



- ✓ Оформлення права користування земельною ділянкою у навчальних закладах



- ✓ Заміна ламп на енергозберігаючі Led



РДА розпочато виконання програм.

Станом на 30.05.2017

**освоєно 77,0 млн. грн.(11,4 %)**

## Заміна вікон



### Найкраще

Дарницький (80,9%)

Деснянський (72,8%)

**Заплановано 29,5 млн. грн.**

**Профінансовано 14,4 млн. грн.**

**Освоєно 48,7 %**

### Не розпочали освоєння

Голосіївський, Печерський,  
Подільський, Солом'янський,  
Шевченківський

# Осінь-зимовий період



## Найкраще

Дарницький (55,9%)

Святошинський (42,5%)

**Заплановано 63,8 млн. грн.**

**Профінансовано 18,2 млн. грн.**

**Освоєно 28,4%**

## Найменше

Шевченківський (0,1%)

Подільський (3,6%)

## Не розпочали освоєння

Голосіївський

# Підготовка до нового навчального року



**Заплановано 197,3 млн. грн.  
Профінансовано 28,3 млн. грн.  
Освоєно 14,3 %**

## **Найкраще**

Шевченківський (37,7%)

Деснянський (34,9%)

## **Найменше**

Печерський (2,1%)

Солом'янський (4,7%)

## **Не розпочали освоєння**

Подільський

## Придбання комп'ютерної техніки



### Найкраще

Подільський (95,9%)

**Заплановано 5,9 млн. грн.  
Профінансовано 0,7 млн. грн.  
Освоєно 11%**

### Не передбачено

Дарницький, Деснянський,  
Солом'янський

### Не розпочали освоєння

Голосіївський, Дніпровський,  
Оболонський, Печерський,  
Святошинський, Шевченківський

# Відновлення груп (місць) у працюючих ДНЗ(за бюджетні кошти)

За планами РУО передбачалося  
відновити **750** місць (**38** груп)

у працюючих садочках

Нарада **11.05.2017**

План уточнено-

**990** місць (**50** груп)

**Заплановано 15,3 млн. грн.**  
**Профінансовано 1,1 млн. грн.**  
**Освоєно 7,4 %**

**вартість  
відновлення  
1 групи за  
бюджетні  
кошти**

**Найбільша**

Святошинський (1,4 млн. грн.)

**Найменша**

Шевченківський (20 тис. грн.)

Дніпровський (40 тис. грн.)

**550 тис. грн**

# Дріб'язок на побутові потреби



**Заплановано 108,8 млн. грн.  
Профінансовано 6,5 млн. грн.  
Освоєно 6%**

## Найкраще

Дніпровський (41,6%)  
Святошинський (5,2%)

## Найменше

Солом'янський (0,4%)  
Оболонський (1,4%)



# Придбання меблів



**Заплановано 87,8 млн. грн.  
Профінансовано 3,8 млн. грн.  
Освоєно 4,3 %**

## **Найкраще**

Деснянський (13,9%)  
Шевченківський (10,5%)

## **Не розпочали освоєння**

Дарницький, Оболонський,  
Подільський, Святошинський,  
Солом'янський



# Оформлення права користування земельною ділянкою у навчальних закладах



**Заплановано 90,7 млн. грн.  
Профінансовано 2,8 млн. грн.  
Освоєно 3,1 %**

## **Найкраще**

Шевченківський (28,0%)

Дарницький (1,5%)

## **Не розпочали освоєння**

Голосіївський, Деснянський,  
Дніпровський, Печерський  
Подільський, Оболонський,  
Святошинський, Солом'янський

# Заміна ламп на енергозберігаючі Led



**Заплановано 77,7 млн. грн.**  
**Профінансовано 1,2 млн. грн.**  
**Освоєно 1,6 %**

## Найкраще


Шевченківський(91,9%)  
Деснянський(16,9%)

## Не розпочали освоєння

Голосіївський, Дарницький,  
Дніпровський, Оболонський,  
Печерський, Святошинський,  
Солом'янський

# 2017

виділено менше коштів ніж у 2016

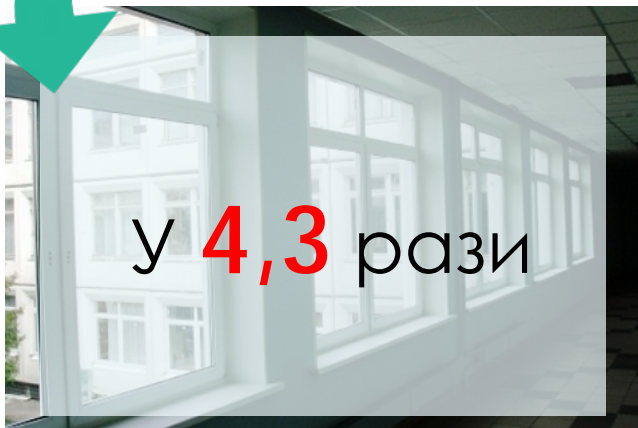

Заміна вікон



Придбання комп'ютерної  
техніки

# Додаткові місця у ДНЗ 2017



## Не передбачено будівництво та реконструкція ДНЗ :

- Подільський
- Солом'янський
- Шевченківський

# Можливо відновити 254 групи



**Немає приміщень  
для відновлення:**  
Печерський



**Майже не залишилось:**  
Святошинський(5),  
Солом'янський(7),  
Подільський(9),  
Шевченківський(11)





**Найбільше приміщень:**  
Оболонський(103),  
Дніпровський(42),  
Деснянський(42)

Завдання Київського Міського голови – відкрити 10 садків за рік

## Планується

 23.06.2017 – НВК «ОРТ» (Дніпровський)

 01.09.2017 – ДНЗ 106 (Голосіївський)  
ДНЗ 362 (Деснянський)

 Впродовж грудня-ДНЗ (Дарницький)  
ДНЗ 658 (Голосіївський)  
ДНЗ 652 (Дарницький)  
ДНЗ 352 (Дніпровський)  
ДНЗ 593 (Оболонський)  
ДНЗ 48 (Печерський)  
ДНЗ 179 (Святошинський)

**Відкрито ДНЗ 370**

26.05.2017 (Дарницький)

# Рейтинг освоєння коштів, передбачених загальноміськими програмами

31.05  
2017

1	Деснянський	2
2	Дарницький	3
2	Дніпровський	7
2	Шевченківський	1
3	Святошинський	7
4	Голосіївський	7
4	Оболонський	6
4	Подільський	6
4	Печерський	5
5	Солом'янський	4

30.06  
2016

